Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe
Studiengang Wirtschaftsinformatik · Modul Methoden der Wirtschaftsinformatik
Fallstudie Systemanalyse · 3. Semester

RepairFlow

Werkstatt-Management als SaaS-Plattform mit KI-Sofortdiagnose

Projektdokumentation

Kurs WWI25B4 · Gruppe 1

Maximilian Ewald · David Leismann · Kilian Platter
Nina Sattler · Jakob Schwan · Adrian Wenzler
Betreuender Dozent: Prof. Dr. Thomas Freytag
Abgabe: 13. November 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Mitglieder der Gruppe und Rollen 2
2 Das Projekt RepairFlow 3
2.1 Ausgangslage und Problem 3
2.2 RepairFlow als Solution Provider 3
2.3 Systemkontext und Systemgrenze 3
2.4 Der Reparaturauftrag als roter Faden 4
2.5 Alleinstellungsmerkmal: die KI-Sofortdiagnose 4
3 Vorgehen bei der Umsetzung 5
3.1 Werkzeuge und Konventionen 5
3.2 Qualitätssicherung 6
4 Projektmanagement 6
4.1 Vorgehensmodell und Kommunikation 6
4.2 Sprintplan und Verlauf 6
4.3 Aufgabensteuerung und Repository 7
4.4 Risiken 7
5 Überblick über die erstellten Artefakte 7
5.1 Geschäftsprozessmodell (BPMN) 7
5.2 Automatisierungspotential 10
5.3 Use-Case-Diagramm 10
5.4 Klassendiagramm 12
5.5 Sequenzdiagramme 15
5.6 Konsistenz zwischen den Modellen 17
6 Probleme und Herausforderungen 18
7 Feedback 19
7.1 Feedback des Dozenten und Umsetzung 19
7.2 Unser Feedback zur Fallstudie 19

1 Mitglieder der Gruppe und Rollen

Die Fallstudie bearbeiten sechs Studierende des Kurses WWI25B4. Beim ersten Gruppentermin am 02.09.2026 haben wir die Rollen nach dem Scrum-Vorgehen verteilt (Kapitel 4) und am 15.10.2026 die Zuständigkeiten für die Fertigstellung festgelegt. Jedes Artefakt hat eine verantwortliche Person (Tabelle 1), und jedes Diagramm prüft eine zweite Person.

Name	Rolle	Zuständigkeit
Nina Sattler	Projektleiterin	Gesamtplanung und Termine; Redaktion der Projektdokumentation (Abbildungen, PDF); Abgabe-Archiv
David Leismann	Stellvertretende Projektleitung, Backup-Beauftragter	Sicherung von Git-Repository und VP-Server; Use-Case-Diagramm und Sequenzdiagramme SD5 und SD6 in Visual Paradigm
Adrian Wenzler	Product Owner	Fachkonzept und Produktentscheidungen; Entscheidungslog; Automatisierungspotential
Kilian Platter	Scrum Master, UML-Verantwortlicher	Sprint-Rituale und Trello-Board; Klassendiagramm, SD1 bis SD4, Visual-Paradigm-Projekt und Konsistenz der UML-Modelle
Maximilian Ewald	BPMN-Verantwortlicher	Die zehn Kollaborationsdiagramme im Camunda Modeler, Prozesskennzahlen und Export
Jakob Schwan	Qualitätsmanager	QA-Checkliste und Review aller Pull Requests; Konsistenz von BPMN, UML und Dokumentation

Tabelle 1: Rollen und Zuständigkeiten

Die Gruppenmitglieder haben folgende Beiträge erarbeitet. Grundlage sind die Aufgabenverteilungen vom 02.09., 05.10. und 15.10.2026.

- **Nina Sattler:** Gesamtplanung und Terminsteuerung, Prüfung der BPMN-Diagramme 07 und 08, Redaktion der Projektdokumentation (Abbildungen, Inhaltsverzeichnis, PDF), Zusammenstellung des Abgabe-Archivs; in der Präsentation Einleitung, Geschäftsmodell und Fazit.
- **David Leismann:** Prüfung der BPMN-Diagramme 03 und 04, Abgleich der Use Cases und Sequenzdiagramme mit den Prozessen, Überarbeitung der Prozesse 05 und 06, Use-Case-Diagramm mit Rollenstruktur sowie SD5 und SD6 in Visual Paradigm; in der Präsentation Problem, Auftragsreise, Rollen und Use Cases.
- **Adrian Wenzler:** Prüfung der BPMN-Diagramme 05 und 06, Fachkonzept (Ausgangslage, Solution Provider, Systemkontext, Zustandsautomat, KI-Sofortdiagnose), Pflege des Entscheidungslogs und Abstimmung der Prozessänderungen mit der Gruppe, Überarbeitung von Prozess 06, Automatisierungspotential, Probleme und Herausforderungen; in der Präsentation Lösung, Nutzenversprechen und KI-Sofortdiagnose.
- **Kilian Platter:** fachliche Prüfung der Diagramme mit Korrekturen, Klassendiagramm, SD1 bis SD4 in Visual Paradigm, Visual-Paradigm-Projekt und Konsistenzprüfung der Sequenzdiagramme gegen das Klassendiagramm, Sprint-Rituale und Trello-Board; in der Präsentation Datenmodell sowie Vorgehen und Projektmanagement.
- **Maximilian Ewald:** Prüfung der BPMN-Diagramme 01 und 02, alle zehn BPMN-Dateien im Camunda Modeler (Anreicherung für Camunda 8, Prüfung im Problems-Panel, PNG-Export), Prozesskennzahlen und Beschreibung der Prozesse; in der Präsentation Ergebnisse, Prozesslandkarte und Prozess-Highlights.

- **Jakob Schwan:** Review der Prozesse 09 und 10, Behebung der Logikfehler in den Prozessen 07 und 08, Fehleranalyse und Korrektur der Prozesse 01 bis 05 sowie der Logikfehler in Prozess 06, QA-Checkliste und Review aller Pull Requests, Konventionen und Konsistenz der Modelle; in der Präsentation Qualität, Herausforderungen und Lernerfahrungen.

2 Das Projekt RepairFlow

2.1 Ausgangslage und Problem

Unser Beispielszenario ist die FixWerk GmbH, eine fiktive Werkstattkette mit vier Filialen in der Region Karlsruhe. Sie repariert Fahrräder und E-Bikes ebenso wie Smartphones, Laptops und Kleingeräte. Wir nehmen an, dass dort mit Papier-Auftragszetteln, Excel-Listen und Telefon gearbeitet wird, und gehen von vier wiederkehrenden Problemen aus:

- Kunden erfahren nicht zuverlässig, wann ein Kostenvoranschlag freizugeben oder ein Gerät abholbereit ist. Es gibt viele Rückfragen per Telefon, und Geräte bleiben wochenlang im Lager.
- Es gibt keinen zentralen Status je Auftrag. Wer wissen will, wo ein Gerät steht, fragt in der Werkstatt nach.
- Jede Filiale bestellt Ersatzteile für sich, auch wenn das Teil in einer Nachbarfiliale liegt.
- Die Auslastung der Techniker ist nicht sichtbar, Termine werden nach Gefühl zugesagt.

2.2 RepairFlow als Solution Provider

RepairFlow ist ein Software-Startup, das Werkstätten eine cloudbasierte Plattform für den gesamten Reparaturablauf anbietet. Sie unterstützt den Prozess von der Kundenanfrage über Diagnose, Kostenvoranschlag (KVA), Ersatzteil-Disposition und Reparatur bis hin zu Abholung, Rechnung und Reklamation. Wir treten als Softwareanbieter auf. Die FixWerk GmbH ist unser Pilotkunde, an dessen Abläufen wir die Anforderungen an die Plattform modellieren.

Die Plattform besteht aus vier Modulen: einem Kundenportal mit App, einem Auftrags- und Werkstattmodul, einem Dispositionsmodul für die filialübergreifende Ersatzteilversorgung sowie einer Abrechnung mit Schnittstelle zur Buchhaltung. Zielkunden sind unabhängige Werkstätten und kleine Ketten mit zwei bis zehn Filialen im deutschsprachigen Raum. Als Geschäftsmodell ist ein monatliches Abonnement je Filiale mit den Stufen Basis (Auftragsverwaltung und Kundenkommunikation) und Pro (zusätzlich filialübergreifende Disposition und KI-Sofortdiagnose) vorgesehen; das Abonnement selbst ist nicht Gegenstand der Modelle. Unser Konzept verbindet Fahrrad-, E-Bike- und Elektronikreparaturen in einer Plattform mit gemeinsamem Ersatzteillager. Einen belegten Funktionsvergleich mit bestehenden Werkstattlösungen haben wir nicht erstellt.

2.3 Systemkontext und Systemgrenze

Abbildung 1 stellt den Systemkontext und die Systemgrenze dar. Innerhalb der Systemgrenze liegt die RepairFlow-Plattform. Der Werkstattbetrieb ist als Mandant angebunden, seine Rollen Service/Annahme, Techniker, Werkstattleitung und Ersatzteil-Disposition arbeiten in der Oberfläche der Plattform. Der Kunde nutzt das Kundenportal. Mit dem Lieferanten tauscht RepairFlow Bestellungen, Bestätigungen, Lieferungen und Retouren aus. Der KI-Diagnosedienst ist ein externer Dienst, den die Plattform zur Auswertung von Foto, Video und Ton aufruft. Außerhalb der Systemgrenze liegen die physische Reparatur, die Systeme der Lieferanten und die Buchhaltung, an die nur über eine Exportschnittstelle übergeben wird.

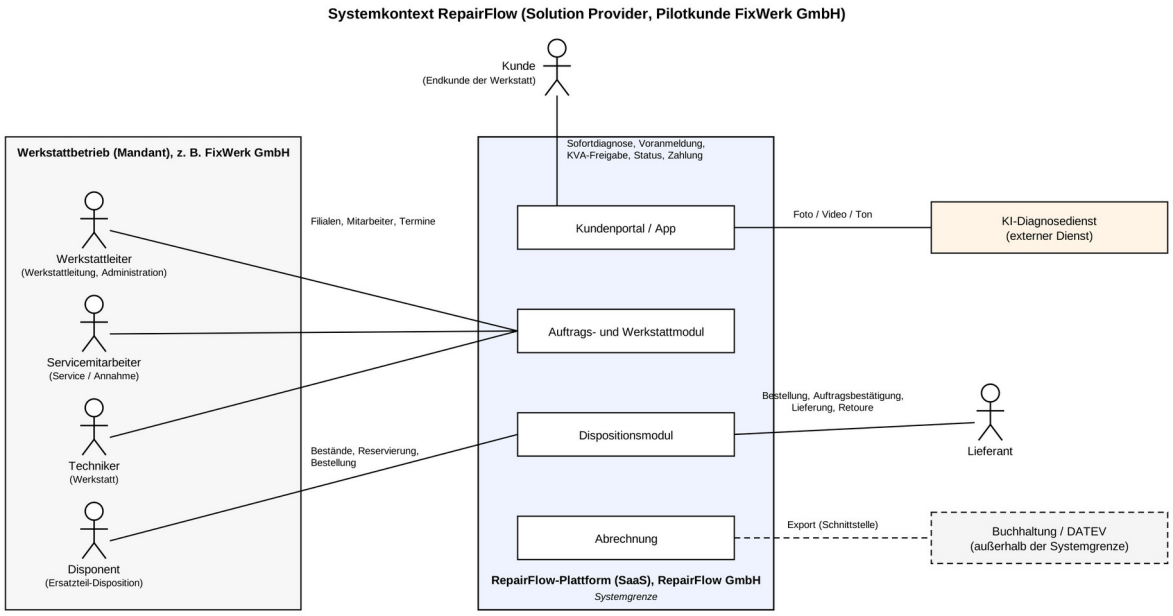


Abbildung 1: Systemkontext der RepairFlow-Plattform

2.4 Der Reparaturauftrag als roter Faden

Alle Modelle verwenden für den Reparaturauftrag dieselben Zustände: angenommen, in Diagnose, KVA offen, freigegeben, abgelehnt, Teile bestellt, in Reparatur, fertig und abgeholt. Im Klassendiagramm sind sie die Werte der Aufzählung AuftragStatus. Die Prozesse 02 bis 08 bilden die Übergänge zwischen diesen Zuständen ab. Prozess 01 (Sofortdiagnose) geht dem Auftrag voraus, Prozess 09 (Reklamation) und Prozess 10 (Retoure) schließen daran an. Nicht jeder Auftrag durchläuft alle Zustände: Ohne Fehlteile entfällt „Teile bestellt“, und ein Nacharbeitsauftrag aus einer Reklamation beginnt ohne erneute Diagnose.

2.5 Alleinstellungsmerkmal: die KI-Sofortdiagnose

Bei der Konzeptvorstellung hat uns der Dozent geraten, das Produkt um ein prägnantes Alleinstellungsmerkmal zu ergänzen, das auch visionär sein darf. Wir haben uns für die KI-Sofortdiagnose entschieden. Sie setzt bei der Ungewissheit an, die Werkstattkunden vor einer Reparatur haben: Was kostet die Reparatur, und wie lange dauert sie?

In der App lädt der Kunde ein Foto des Schadens, ein Video oder eine Tonaufnahme hoch, etwa das Klackern eines E-Bike-Motors. RepairFlow legt daraus eine Voranmeldung an. Der KI-Diagnosedienst schlägt Gerätetyp, wahrscheinliche Fehlerursache und benötigte Ersatzteile vor. Daraus berechnet RepairFlow einen vorläufigen KVA, prüft die Teileverfügbarkeit in allen Filialen und schlägt Filiale und Termin vor. Bestätigt der Kunde, werden die Teile vorreserviert. In der Werkstatt prüft der Techniker den Vorschlag und bestätigt oder korrigiert ihn.

Ein Teil davon ist heute machbar, etwa das Erkennen sichtbarer Schäden wie eines gebrochenen Displays per Bildanalyse. Die Auswertung von Motorgeräuschen und die Schätzung von Arbeitszeiten aus einem Video sind Vision. Deshalb bleibt der Vorschlag im Modell unverbindlich: Der KVA hat den Status „vorläufig“, und bei nicht auswertbaren Medien fragt das System nach einer besseren Aufnahme. In den Modellen erscheint das Merkmal als Prozess 01, als Use Cases „Sofortdiagnose anfordern“, „Voranmeldung bestätigen“ und „Diagnosevorschlag prüfen“, als Klassen Voranmeldung, Medienanhang und KIDiagnosevorschlag sowie als Sequenzdiagramm SD1.

3 Vorgehen bei der Umsetzung

Wir sind in sechs Schritten vorgegangen (Tabelle 2). Die Reihenfolge folgt der Vorlesung: zuerst die Geschäftsprozessanalyse, dann das Automatisierungspotential, danach die objektorientierte Analyse.

Schritt	Phase	Inhalt und Ergebnis
1	Themenfindung	Startup-Ideen gesammelt und nach Prozessreichtum und Automatisierungspotential bewertet; Entscheidung für das Werkstatt-Szenario.
2	Konzeptvorstellung	Kickoff-Pitch am 31.08.2026. Rückmeldung des Dozenten: Perspektive klären und ein Alleinstellungsmerkmal ergänzen. Ergebnis: Solution Provider mit KI-Sofortdiagnose.
3	Prozessanalyse	Abläufe im Pilotbetrieb beschrieben, Soll-Prozesse mit RepairFlow abgeleitet, Prozessliste und Namenskonventionen festgelegt.
4	BPMN-Modellierung	Zehn Kollaborationsdiagramme mit Pools, Lanes, Datenobjekten und Datenspeichern; Prüfung im Zweierteam und mit dem Camunda-Linter.
5	Objektorientierte Analyse	Use-Case-Diagramm aus der Systemgrenze, Klassendiagramm aus den Datenobjekten, sechs Sequenzdiagramme; Umsetzung in Visual Paradigm.
6	Dokumentation und Präsentation	Projektdokumentation, Abschlusspräsentation mit Zuordnung der Vortragenden, Abgabe-Archiv.

Tabelle 2: Vorgehen in sechs Schritten

3.1 Werkzeuge und Konventionen

Die BPMN-Diagramme haben wir im Camunda Modeler (Camunda 8) erstellt. Automatisierte Aktivitäten tragen Task-Definitionen, Timer haben ISO-Dauern und Verzweigungen FEEL-Bedingungen, damit der Modeler die Diagramme ohne Fehlermeldung prüft. Das UML-Modell liegt in Visual Paradigm 18 auf dem Teamwork-Server der DHBW (Repository WWI25B4G1). Die Sequenzdiagramme sind dort als Unterdiagramme ihrer Use Cases angelegt. Als gemeinsame Ablage für BPMN-Dateien, Dokumentation, Entscheidungslog und Präsentation nutzen wir ein GitHub-Repository. Die Aufgaben steuern wir über ein Trello-Board.

Damit die Modelle zusammenpassen, haben wir uns in Sprint 1 auf gemeinsame Regeln geeinigt:

- BPMN-Datenobjekte tragen die Klassennamen des Klassendiagramms, im Diagramm zur Lesbarkeit mit Bindestrich getrennt und bei Bedarf mit Zustand in eckigen Klammern, zum Beispiel „Reparatur-auftrag [freigegeben]“.
- Aktivitäten heißen Verb mit Objekt („Kundendaten erfassen“), Ereignisse stehen im Partizip Perfekt („Auftrag angenommen“).
- Jeder Prozess hat auf Prozessebene genau ein Start- und ein Endereignis. Alternative Ausgänge werden vor dem Ende zusammengeführt.
- Die Beteiligten erscheinen in BPMN als Pool (Kunde) oder Lane (Service / Annahme, Techniker, Ersatzteil-Disposition, Werkstattleitung), im Use-Case-Diagramm als Rollen mit genau einem Use Case je Rolle (Tabelle 7), in den Sequenzdiagrammen als Akteure mit demselben Rollennamen und im Klassendiagramm als Unterklassen von Mitarbeiter. Welche Rolle zu welcher Klasse und Lane gehört, legt Tabelle 7 fest.
- Die Statuswerte des Reparaturauftrags entsprechen in allen Modellen der Aufzählung AuftragStatus.

3.2 Qualitätssicherung

Jedes Artefakt durchläuft eine Definition of Done: eigener Branch, Pull Request, Review durch eine zweite Person und Abnahme anhand der QA-Checkliste. Jakob prüft die Änderungen gegen die QA-Checkliste, danach werden sie zusammengeführt. Für die UML-Modelle gilt außerdem die Regel „Botschaft = Operation der Klasse“: Jede Lebenslinie eines Sequenzdiagramms ist eine Klasse oder ein Akteur, jede Botschaft an ein Objekt eine Operation dieser Klasse.

Jedes Diagramm ist denselben Weg gegangen: Entwurf im Zweierteam, gegenseitiges Review, Abstimmung im Gruppentermin und erst dann die Umsetzung über einen Pull Request. In Sprint 1 fanden wir dabei vor allem fachliche Fehler, etwa abweichende Begriffe zwischen Prozess- und Klassenmodell, die wir gegenseitig überarbeitet haben. In Sprint 2 ergab die gemeinsame Prüfung in der Gesamtgruppe nur noch kleinere Fehler in den Details. Die Korrekturen sind im Entscheidungslog festgehalten.

4 Projektmanagement

4.1 Vorgehensmodell und Kommunikation

Wir arbeiten nach Scrum. Der Product Owner priorisiert den Backlog und nimmt Ergebnisse im Sprint Review ab, der Scrum Master moderiert die Termine und pflegt das Board. Jede Aufgabe ist genau einer Person zugeordnet. Wie in der Aufgabenstellung vorgesehen, gibt es zusätzlich eine Projektleitung, die Planung und Termine koordiniert.

Den Takt geben die vier Gruppentermine in Präsenz vor (jeweils 4:15 Stunden). Jeder Termin verbindet Review und Retrospektive des vergangenen Sprints mit dem Planning des nächsten, und Hinweise aus dem Coaching fließen direkt in die Planung ein. Zwischen den Terminen arbeiten wir asynchron. Abgestimmt wird in einer WhatsApp-Gruppe, Dateien teilen wir nur über das GitHub-Repository.

4.2 Sprintplan und Verlauf

Sprint	Zeitraum	Ziel	Ergebnis
Sprint 1	02.09.2026	Diagramme erstellen und im Zweierteam prüfen	Rollen, Konventionen und Repository festgelegt; je zwei BPMN-Diagramme an fünf Personen zur Prüfung verteilt, Review-Protokoll zu 09 und 10; UML-Modell als Importdatei (XMI) vorbereitet.
Sprint 2	03.09.–05.10.2026	Korrekturen und Verhalten	Gemeinsame Prüfung mit Korrekturen an BPMN und UML, sechs Sequenzdiagramme an die Prozesse angeglichen; Grundsatzentscheidungen am 05.10.
Sprint 3	06.10.–15.10.2026	Fertigstellung	QA-Befunde behoben, Zuständigkeiten für die Fertigstellung festgelegt, Use-Case-Diagramm nach dem Dozentenhinweis auf Rollen umgestellt.
Sprint 4	16.10.–22.10.2026	Generalprobe	*[Ergebnis nach dem 22.10. ergänzen]*
Abschluss	27.10. und 13.11.2026	Präsentation und Abgabe	Präsentation am 27.10.2026 in Raum B458, Abgabe bis 13.11.2026 über Moodle.

Tabelle 3: Sprints und Ergebnisse

4.3 Aufgabensteuerung und Repository

Das Trello-Board hat eine Liste je Termin. Jede Karte nennt eine verantwortliche Person und, wo ein Diagramm entsteht, den Teampartner als Prüfer. Änderungen am Repository laufen über einen festen Git-Ablauf: aktuellen Stand holen, eigener Branch je Aufgabe, Pull Request, Review durch eine zweite Person und Merge. Commit-Nachrichten tragen einen Termin-Stempel mit Terminnummer und Datum, etwa [T04 2026-10-05] für den Gruppentermin am 05.10.2026. Entscheidungen, die mehrere Personen betreffen, halten wir im Entscheidungslog fest. Word- und PowerPoint-Dateien lassen sich nicht automatisch zusammenführen, deshalb kündigen wir ihre Bearbeitung vorher in der WhatsApp-Gruppe an.

Die BPMN-Modelle liegen nur im Git-Repository. Die im Ablauf genannte Camunda Cloud nutzen wir in Absprache mit dem Dozenten nicht, weil die Installationsanleitung Git als Repository empfiehlt. Für UML ist der VP-Teamwork-Server das Repository, zusätzlich sichern wir die VPP-Datei im Git.

4.4 Risiken

Tabelle 4 fasst die wichtigsten Risiken und unsere Gegenmaßnahmen zusammen.

Risiko	Bewertung	Gegenmaßnahme
Modelle laufen auseinander (Namen, Status, Rollen)	hoch	Gemeinsame Namensregeln, Konsistenzprüfung vor jedem Merge, Zuordnungstabelle in Abschnitt 5.6
Mehrere Fassungen derselben Modelle	hoch	Nur ein verbindlicher Stand im Repository; Abweichungen werden verglichen und im Entscheidungslog entschieden
VP-Teamwork-Server nur über VPN erreichbar	mittel	Lehre-VPN, regelmäßige lokale Sicherung der VPP-Datei
Ausfall eines Mitglieds vor der Präsentation	niedrig	Folien und Sprecherzuordnung im Repository, Vertretung bei der Generalprobe abstimmen

Tabelle 4: Risiken und Gegenmaßnahmen

5 Überblick über die erstellten Artefakte

Tabelle 5 zeigt, was wir abgeben. Alle vier Dateien liegen im Archiv Fallstudie-WWI25B4-Gruppe1.zip, das jedes Gruppenmitglied selbst in Moodle hochlädt. Die Abschnitte danach beschreiben die Modelle und zeigen jeweils ausgewählte Diagramme.

Datei	Inhalt
Projekt-WWI25B4-Gruppe1.pdf	Diese Projektdokumentation
BPMN-WWI25B4-Gruppe1.zip	Zehn BPMN-2.0-Kollaborationsdiagramme als XML, benannt 01-Sofortdiagnose.bpmn bis 10-Retoure.bpmn
UML-WWI25B4-Gruppe1.vpp	Visual-Paradigm-Projekt mit Use-Case-Diagramm, Klassendiagramm und sechs Sequenzdiagrammen als Unterdiagramme der Use Cases
Praesentation-WWI25B4-Gruppe1.pdf	Abschlusspräsentation mit Angabe, wer welchen Teil vorträgt

Tabelle 5: Abgegebene Artefakte

5.1 Geschäftsprozessmodell (BPMN)

Wir haben zehn Soll-Prozesse unseres Pilotkunden als Kollaborationsdiagramme modelliert (Tabelle 6). Zusammen enthalten sie 133 Aktivitäten im Werkstatt-Pool, im Schnitt 13,3 je Diagramm. Hinzu

kommen 26 Aktivitäten in den Abläufen des Kunden, 42 Nachrichtenflüsse sowie 51 Datenobjekte und 12 Datenspeicher.

Nr	Prozess	Auslöser (Start)	Ergebnis (Ende)	Pools	Akt.	davon autom.
01	KI-Sofortdiagnose und Voranmeldung	Anfrage eingegangen	Sofortdiagnose abgeschlossen	Werkstattbetrieb, Kunde	12	12 (100 %)
02	Auftragsannahme, Geräteregistrierung und Terminplanung	Kunde erschienen	Auftrag angenommen	Werkstattbetrieb, Kunde	12	4 (33 %)
03	Fehlerdiagnose	Auftrag eingeplant	Diagnose abgeschlossen	Werkstattbetrieb, Kunde	12	5 (42 %)
04	Kostenvoranschlag und Kundenfreigabe	KVA angestoßen	KVA-Entscheidung verarbeitet	Werkstattbetrieb, Kunde	11	7 (64 %)
05	Ersatzteil-Verfügbarkeit und Reservierung	KVA freigegeben	Ersatzteile disponiert	Werkstattbetrieb, Kunde	15	12 (80 %)
06	Ersatzteil-Bestellung beim Lieferanten	Bestellbedarf gemeldet	Bestellung abgeschlossen	Werkstattbetrieb, Lieferant, Kunde	15	9 (60 %)
07	Reparaturdurchführung und Arbeitszeiterfassung	Ersatzteile disponiert	Reparatur abgeschlossen	Werkstattbetrieb, Kunde	13	5 (38 %)
08	Abholung, Rechnung und Zahlung	Gerät abholbereit	Auftrag abgeschlossen	Werkstattbetrieb, Kunde	17	11 (65 %)
09	Reklamation und Gewährleistung	Mangel gemeldet	Reklamation abgeschlossen	Werkstattbetrieb, Kunde	15	8 (53 %)
10	Ersatzteil-Retoure und Lieferanten-Reklamation	Mangelhaftes Teil festgestellt	Retoure abgeschlossen	Werkstattbetrieb, Lieferant	11	8 (73 %)

Tabelle 6: Prozesslandkarte mit Kennzahlen

Der Pool Werkstattbetrieb enthält den ausführbaren Prozess. Seine Lanes sind die Rollen Service/Annahme, Techniker, Werkstattleitung und Ersatzteil-Disposition. Kunde und Lieferant sind eigene Pools, mit denen nur über Nachrichtenflüsse kommuniziert wird. Der Kunde hat in den Prozessen 01 bis 09 einen eigenen, nicht ausführbaren Ablauf. So ist sichtbar, wann er antwortet und wie der Vorgang für ihn endet. Den Lieferanten modellieren wir als Black Box, weil wir seine internen Abläufe nicht kennen. Für die Software gibt es keine eigene Lane. Ob RepairFlow einen Schritt allein erledigt, zeigt der Aktivitätstyp: Service Task (automatisch), Business Rule Task (Regel oder KI), Send- und Receive Task (Nachricht über die Plattform), User Task (Mitarbeiter in der Plattform) und Manual Task (außerhalb der Software).

Die Prozesse greifen über Aufruf-Aktivitäten ineinander. Ein freigegebener KVA (04) startet die Disposition (05), Fehlteile lösen die Bestellung aus (06), und die Rückgabe jedes Geräts läuft über Prozess 08, auch nach einer Ablehnung oder Reklamation. Jede Warteschleife hat einen Ausstieg. Bleibt der KVA dreimal drei Tage ohne Antwort, gilt er als abgelehnt, ausstehende Lieferungen werden zweimal angemahnt, bevor storniert wird, und nach der zweiten erfolglosen Nacharbeit wird ein Auftrag abgelehnt. Abbildung 2 und Abbildung 3 zeigen zwei der zehn Diagramme. Alle Diagramme liegen vollständig in BPMN-WWI25B4-Gruppe1.zip.

Die zehn Prozesse im Überblick:

- **01 KI-Sofortdiagnose und Voranmeldung.** Aus Foto, Video oder Ton des Kunden entstehen Voranmeldung, KI-Diagnosevorschlag, vorläufiger KVA und Terminvorschlag. Nicht auswertbare Medien fordert das System neu an. Ohne Antwort binnen sieben Tagen wird die Voranmeldung verworfen.
- **02 Auftragsannahme und Terminplanung.** Das Gerät wird angenommen, Daten einer Voranmeldung werden übernommen. Die Werkstattleitung prüft die Auslastung, leitet bei Bedarf an eine andere Filiale um und weist einen Techniker zu.
- **03 Fehlerdiagnose.** Der Techniker sichtet den KI-Vorschlag, sofern eine Voranmeldung vorliegt, misst und dokumentiert den Befund. Findet er keinen Fehler oder ist die Reparatur nicht wirtschaftlich, etwa bei Totalschaden, wird der Auftrag abgelehnt, und das Gerät geht über Prozess 08 mit Diagnosepauschale zurück.
- **04 Kostenvoranschlag und Kundenfreigabe.** Der KVA wird berechnet, geprüft und versendet. Bleibt die Antwort drei Tage aus, wird er mit Erinnerung erneut gesendet. Nach dem dritten Fristablauf ohne Antwort gilt er als abgelehnt.
- **05 Ersatzteil-Verfügbarkeit und Reservierung.** Vorreservierungen aus der Sofortdiagnose werden zuerst übernommen. Je offenem Teil wird danach die eigene, dann jede andere Filiale geprüft. Teile werden reserviert oder umgelagert, Fehlteile gehen an Prozess 06.
- **06 Ersatzteil-Bestellung.** Fehlteile und Nachbestellvorschläge werden gebündelt bestellt, oberhalb einer Freigabegrenze erst nach Freigabe. Ohne Bestätigung oder nach zwei erfolglosen Mahnungen wird storniert und ein anderer Lieferant gesucht.
- **07 Reparaturdurchführung.** Der Techniker erfasst Schritte und Arbeitszeit. Ein Zusatzbefund führt zu einem Nachtrags-KVA. Nach bestandener Endkontrolle ist der Auftrag fertig, nach der zweiten erfolglosen Nacharbeit abgelehnt.
- **08 Abholung, Rechnung und Zahlung.** Rechnung, Benachrichtigung, Übergabe und Zahlung. Holt der Kunde nicht ab, folgen Erinnerungen, Lagergebühr und Verwertung, offene Rechnungen werden gemahnt und nach der dritten erfolglosen Mahnung an Inkasso übergeben.
- **09 Reklamation und Gewährleistung.** Der Mangel wird geprüft und die Gewährleistung bewertet. Kostenfreie Nacharbeit gibt die Werkstattleitung frei, sonst entscheidet der Kunde über ein Angebot.
- **10 Ersatzteil-Retoure.** Defekte Lieferantenteile werden angemeldet und zurückgesendet. Danach folgt eine Gutschrift oder eine Ersatzlieferung, ohne Antwort nach der Eskalation wird das Teil abgeschrieben.

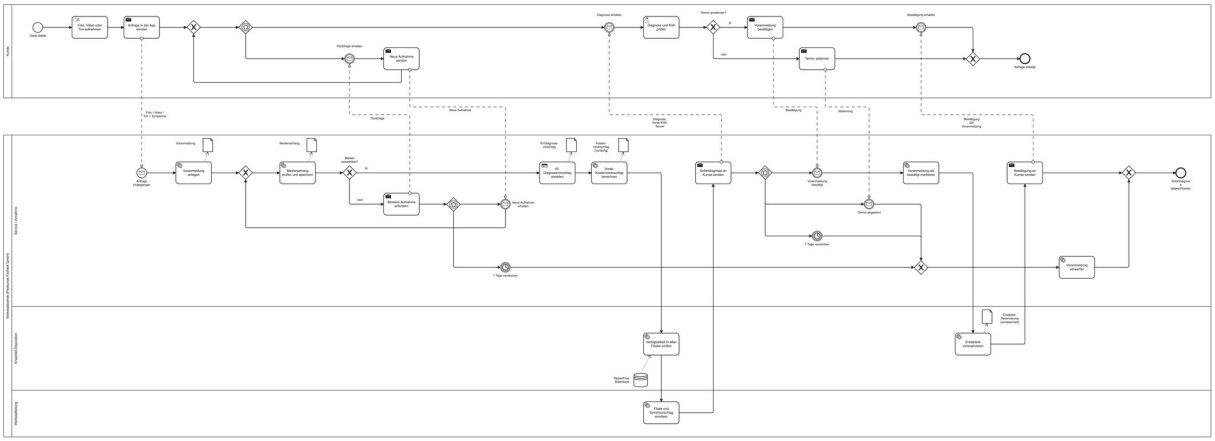


Abbildung 2: Prozess 01 KI-Sofortdiagnose und Voranmeldung

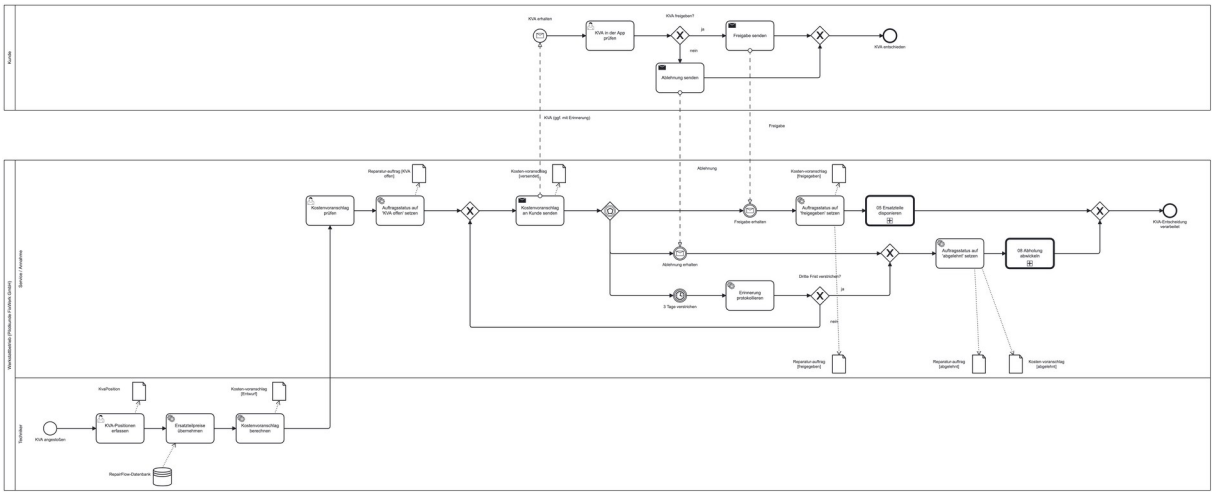


Abbildung 3: Prozess 04 Kostenvoranschlag und Kundenfreigabe

5.2 Automatisierungspotential

Von den 133 Aktivitäten sind 81 automatisiert, regelbasiert oder Nachrichten der Plattform, also rund 61 Prozent. 33 weitere sind Benutzer-Aktivitäten in der Plattform. Neun manuelle Aktivitäten liegen außerhalb der Software, neun rufen einen anderen Prozess auf, und eine ist der Mehrfach-Teilprozess für die Prüfung je Ersatzteil. Die Software automatisiert vor allem:

- die Statusführung des Reparaturauftrags mit Fristen, Erinnerungen, Mahnungen und Lagergebühr,
- die Kundenkommunikation von der Sofortdiagnose bis zur Bewertungsanfrage,
- die Berechnung von KVA und Rechnung aus Positionen, Ersatzteilpreisen und Arbeitszeiten,
- die filialübergreifende Disposition mit Verfügbarkeitsprüfung, Reservierung, Umlagerung und Nachbestellvorschlag,
- regelbasierte Entscheidungen wie Wirtschaftlichkeit, Gewährleistung und Freigabegrenze sowie die KI-Sofortdiagnose.

5.3 Use-Case-Diagramm

Das Use-Case-Diagramm (Abbildung 4) zeigt, was RepairFlow aus Sicht seiner Benutzer leistet. Es enthält 19 Use Cases und 17 Akteure: den Kunden, 15 Mitarbeiterrollen und den KI-Diagnosedienst als externes System. Der Lieferant ist kein Akteur, sondern eine Black Box ohne Zugang zu RepairFlow; wie in den Prozessmodellen kommt er nur über Nachrichten vor. Jeder Use Case hat genau eine Rolle als primären Akteur; die Nummern UC01 bis UC19 dienen nur der Zuordnung in den Tabellen, im Diagramm stehen die Namen. Diese Struktur geht auf einen Hinweis des Dozenten vom 15.10.2026 zurück: Unsere erste Fassung hatte acht Akteure mit bis zu acht Verbindungen, etwa den Techniker an Diagnose, KVA, Reparatur, Fertigmeldung und Reklamation. Statt eines Akteurs mit vielen Linien gibt es jetzt je Use Case eine Rolle, zum Beispiel Diagnoseprüfer, Diagnostiker, Kalkulator, Reparateur und Endkontrolleur anstelle des Technikers. Welche Person eine Rolle ausfüllt, regelt das Organigramm des Werkstattbetriebs; im Modell sind das die Unterklassen von Mitarbeiter (Tabelle 7). Der Kunde ist einmal dargestellt und mit UC01, UC02 und UC07 verbunden. UC08 „Ersatzteil-Verfügbarkeit prüfen“ wird nur über include erreicht und hat deshalb keinen eigenen Akteur.

Rolle (Akteur)	Use Case	Klasse im Klassendiagramm	Lane / Pool in BPMN
Kunde	UC01 Sofortdiagnose anfordern; UC02 Voranmeldung bestätigen; UC07 KVA freigeben / ablehnen	Kunde	Pool Kunde
Serviceannahme	UC03 Reparaturauftrag anlegen	Servicemitarbeiter	Service / Annahme
Geräteausgabe	UC15 Abholung und Abrechnung abwickeln	Servicemitarbeiter	Service / Annahme
Reklamationsbearbeiter	UC16 Reklamation bearbeiten	Servicemitarbeiter	Service / Annahme
Diagnoseprüfer	UC04 Diagnosevorschlag prüfen	Techniker	Techniker
Diagnostiker	UC05 Diagnosebefund erfassen	Techniker	Techniker
Kalkulator	UC06 KVA erstellen	Techniker	Techniker
Reparateur	UC13 Reparaturschritt und Arbeitszeit erfassen	Techniker	Techniker
Endkontrolleur	UC14 Auftrag fertigmelden	Techniker	Techniker
Teiledisponent	UC09 Ersatzteile disponieren und reservieren	Disponent	Ersatzteil-Disposition
Bestandsplaner	UC12 Nachbestellvorschlag erzeugen	Disponent	Ersatzteil-Disposition
Einkäufer	UC10 Lieferantenbestellung auslösen	Disponent	Ersatzteil-Disposition
Wareneingang	UC11 Wareneingang buchen	Disponent	Ersatzteil-Disposition
Retourenbearbeiter	UC19 Retoure abwickeln	Disponent	Ersatzteil-Disposition
Werkstattplaner	UC17 Werkstatttermin planen und Techniker zuweisen	Werkstattleiter	Werkstattleitung
Betriebsadministrator	UC18 Werkstattbetrieb und Filialen verwalten	Werkstattbetrieb («mandant»)	außerhalb der zehn Prozesse
KI-Diagnosedienst (extern)	UC01 Sofortdiagnose anfordern	KIDiagnosevorschlag	Nachrichtenfluss in Prozess 01

Tabelle 7: Rollen des Use-Case-Diagramms und ihre Entsprechung in Klassen- und Prozessmodell

Zwei include-Beziehungen stehen für Teilschritte, die immer ausgeführt werden: „Sofortdiagnose anfordern“ und „Ersatzteile disponieren und reservieren“ schließen „Ersatzteil-Verfügbarkeit prüfen“ ein. Sechs extend-Beziehungen beschreiben bedingtes Verhalten. So erweitert „Lieferantenbestellung auslösen“ die Disposition nur, wenn Fehlteile vorhanden sind, und „Retoure abwickeln“ den Wareneingang nur bei mangelhafter Lieferung.

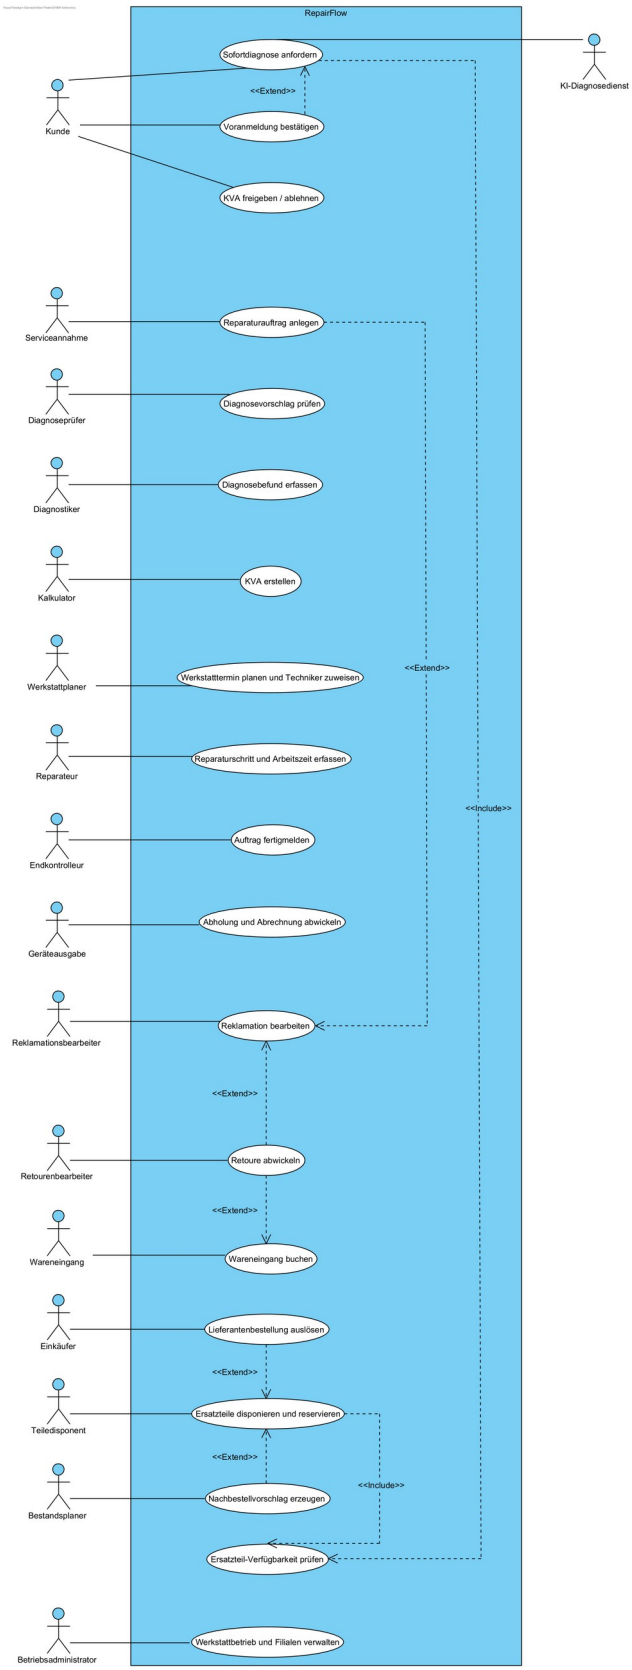


Abbildung 4: Use-Case-Diagramm RepairFlow

5.4 Klassendiagramm

Das Klassendiagramm (Abbildung 5) umfasst 27 Klassen, darunter die abstrakten Klassen Person und Mitarbeiter, sowie sieben Aufzählungen und 36 Assoziationen. Wichtige Entwurfsentscheidungen sind:

- **Reparaturauftrag im Zentrum.** Fehlerbefund und Reparaturschritte existieren nur mit ihrem Auftrag und sind Kompositionen. Der KVA ist nur assoziiert, weil der vorläufige KVA der Sofortdiagnose schon vor dem Auftrag entsteht. Der Auftrag hält den Status und die Operation wechsleStatus().
- **Lagerbestand je Filiale.** Ein Ersatzteil ist ein Stammdatum, sein Bestand unterscheidet sich je Filiale. Erst die Klasse Lagerbestand zwischen Ersatzteil und Filiale macht die filialübergreifende Verfügbarkeitsprüfung möglich.
- **Reservierung als eigene Klasse.** ErsatzteilReservierung hat Menge, Datum und einen eigenen Lebenszyklus (vorreserviert, reserviert, entnommen, storniert) und hängt an einem Auftrag oder bei der Sofortdiagnose an einer Voranmeldung.
- **Mandant und Rollen.** Der Werkstattbetrieb steht als Mandant über Filialen und Mitarbeitern. Die Unterklassen von Mitarbeiter (Servicemitarbeiter, Techniker, Disponent, Werkstattleiter) entsprechen den Lanes, bündeln die Rollen des Use-Case-Diagramms (Tabelle 7) und tragen die Operationen dieser Rollen.
- **Nacharbeit als neuer Auftrag.** Eine Reklamation verweist auf den Ursprungsauftrag und führt zu einem neuen Reparaturauftrag, dessen Attribut kostenfrei angibt, ob die Gewährleistung greift.

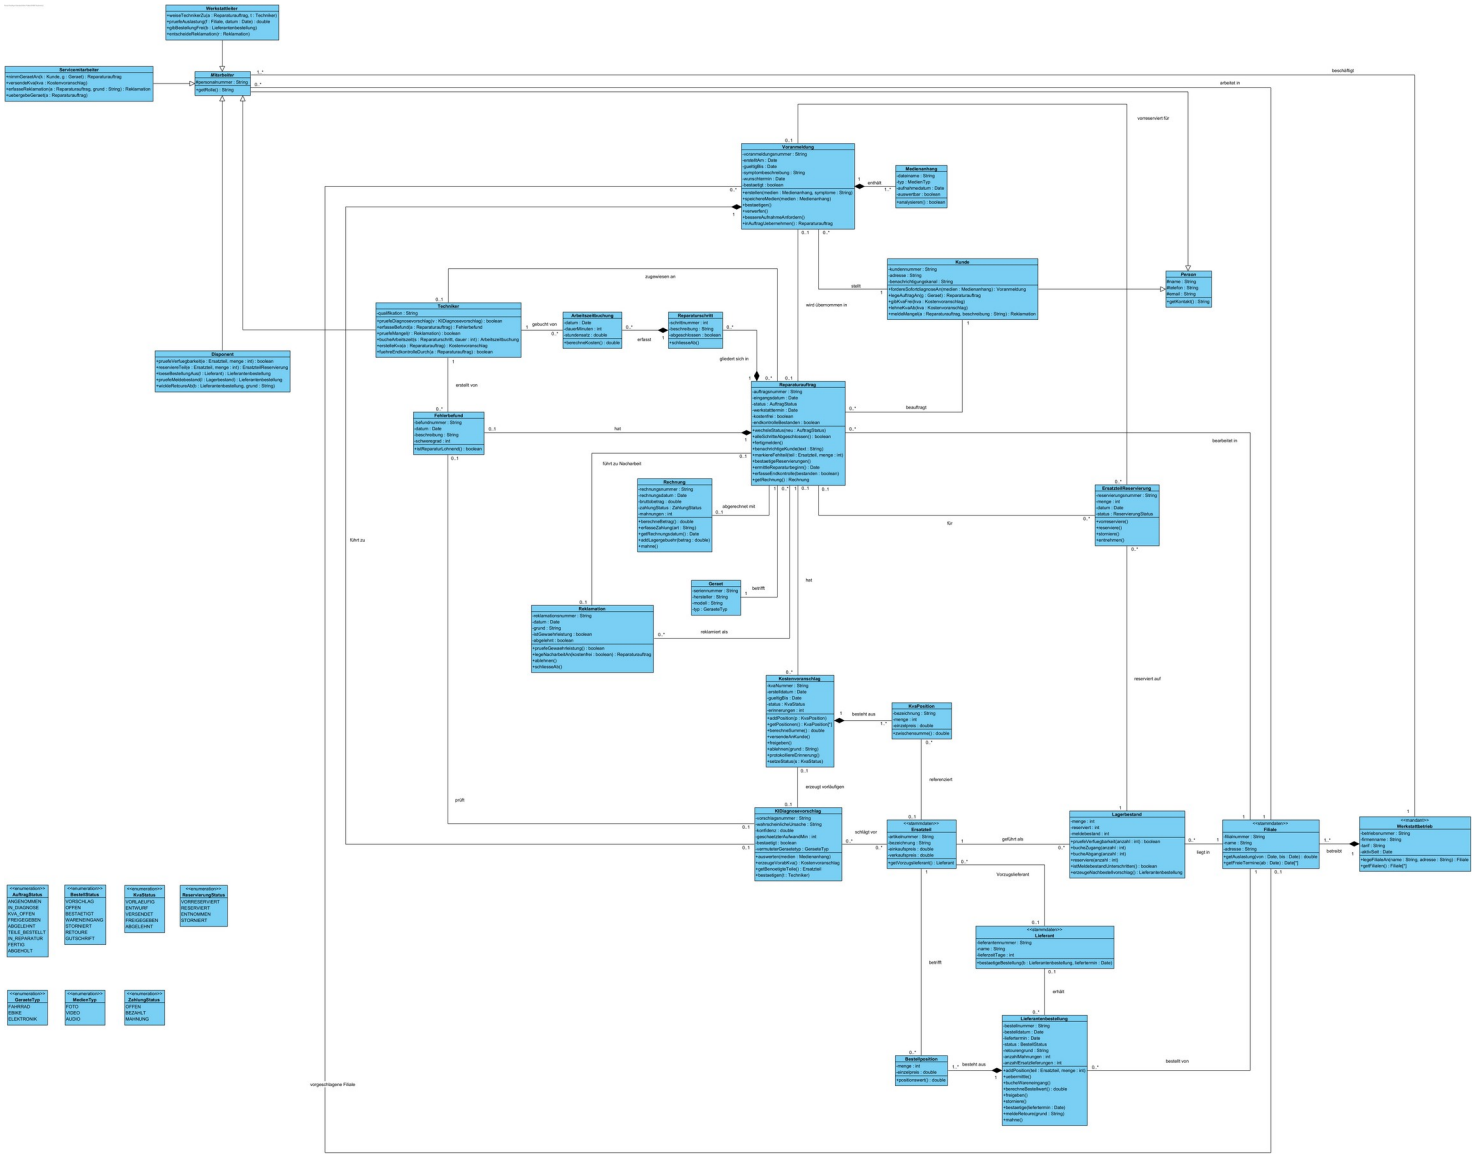


Abbildung 5: Klassendiagramm RepairFlow

5.5 Sequenzdiagramme

Für sechs Use Cases haben wir Sequenzdiagramme erstellt, gefordert waren fünf (Tabelle 8). Jedes folgt einem Prozess. Die erste Lebenslinie ist die Rolle des Use Case aus Abbildung 4; weitere beteiligte Rollen tragen ihren Namen aus dem Use-Case-Diagramm; der Werkstattleiter, der dort keine Rolle hat, erscheint als Objekt seiner Klasse (: Werkstattleiter) mit seinen Operationen. Der Lieferant liegt außerhalb des Systems, Nachrichten an ihn sind in SD6 Lost bzw. Found Messages. Die übrigen Lebenslinien sind Objekte der Klassen, Botschaften an Objekte sind Operationen des Klassendiagramms. Kombinierte Fragmente bilden Verzweigungen (alt, opt), Schleifen (loop), Abbrüche (break) und Verweise auf andere Use Cases (ref) ab.

Diagramm	Use Case	Prozess	Kern des Ablaufs
SD1	UC01 Sofortdiagnose anfordern	01	Medienprüfung mit Nachreichen, KI-Vorschlag, vorläufiger KVA, Terminvorschlag, Vorreservierung erst nach Bestätigung
SD2	UC07 KVA freigeben / ablehnen	04	Versand, Erinnerung nach je drei Tagen, Ablehnung nach dem dritten Fristablauf, Freigabe startet die Disposition, Ablehnung führt zur Abholung
SD3	UC09 Ersatzteile disponieren und reservieren	05	Prüfung je Teil in einer Schleife: eigener Bestand, andere Filiale oder Fehlteil; Vorreservierung aus der Sofortdiagnose; Meldebestand; Fehlteile führen zu UC10
SD4	UC14 Auftrag fertigmelden	07	Fertigmeldung erst nach Endkontrolle, höchstens zwei Nacharbeiten, sonst Status abgelehnt
SD5	UC16 Reklamation bearbeiten	09	Mangelprüfung, Gewährleistung, Nacharbeitsauftrag nur nach Freigabe oder Annahme
SD6	UC10 Lieferantenbestellung auslösen	06	Bündelung, Freigabe durch den Werkstattleiter ab Freigabegrenze, Bestellung, Bestätigung oder Storno nach zwei Mahnungen; Nachrichten an den Lieferanten als Lost Messages

Tabelle 8: Die sechs Sequenzdiagramme

Abbildung 6 zeigt SD1 zum Alleinstellungsmerkmal, Abbildung 7 SD3 zur filialübergreifenden Disposition.

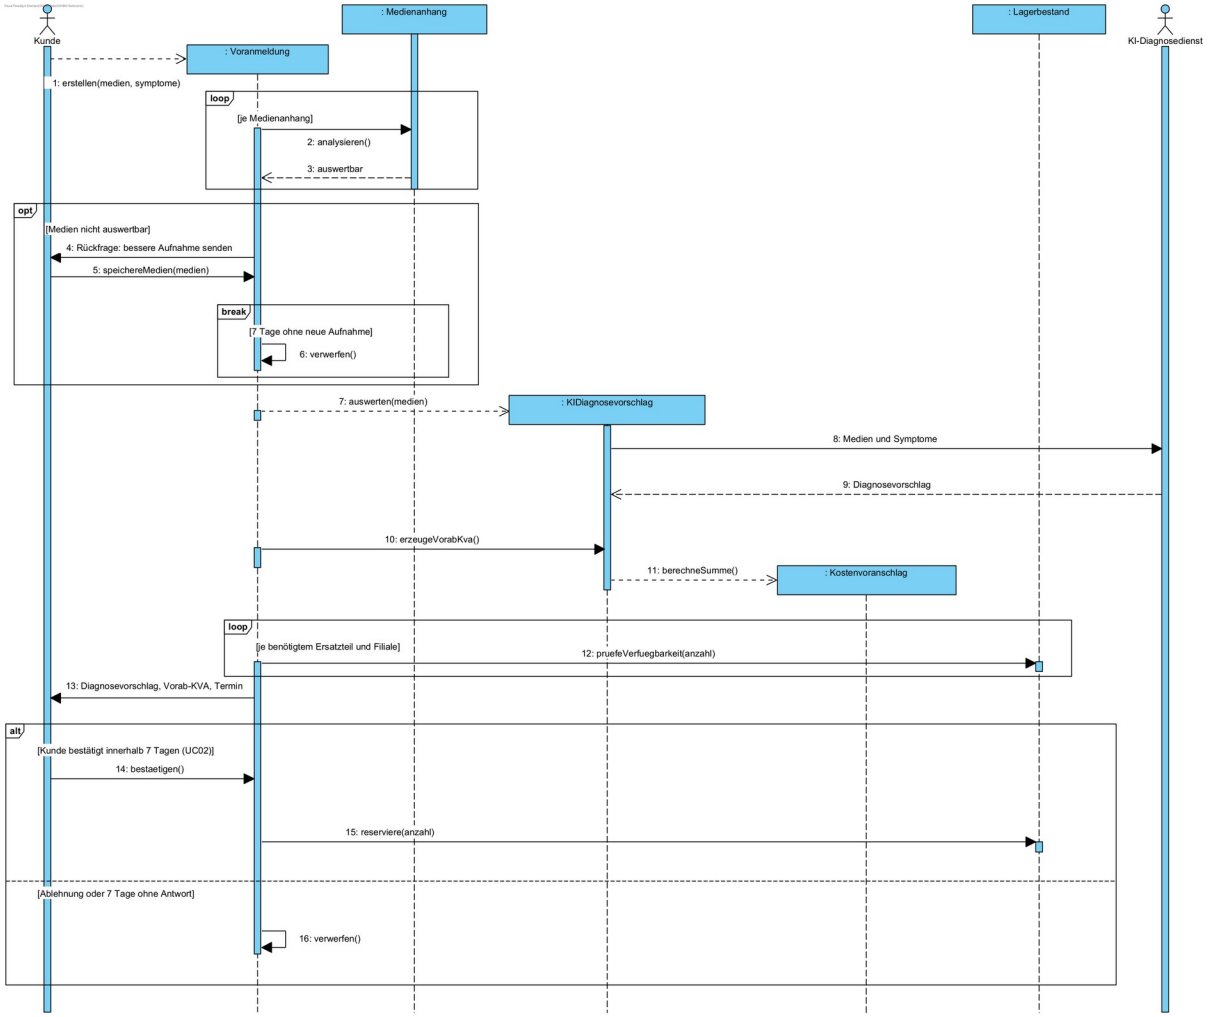


Abbildung 6: SD1 Sofortdiagnose anfordern (UC01)

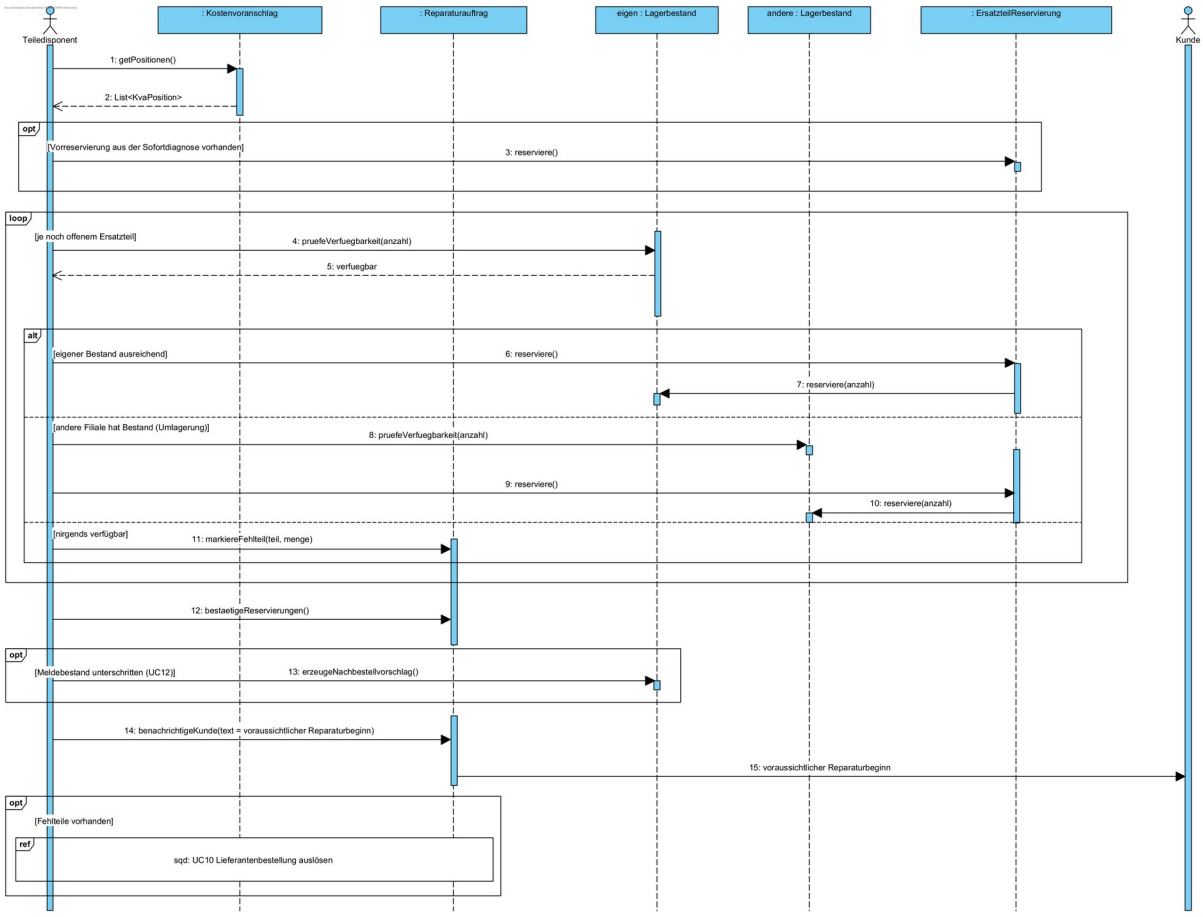


Abbildung 7: SD3 Ersatzteile disponieren und reservieren (UC09)

5.6 Konsistenz zwischen den Modellen

Tabelle 9 ordnet jedem Prozess seine Use Cases, zentralen Klassen und Sequenzdiagramme zu. BPMN-Datenobjekte tragen die Klassennamen, jede Rolle des Use-Case-Diagramms gehört zu genau einer Lane und einer Mitarbeiterklasse (Tabelle 7), und die Zustände des Reparaturauftrags folgen in allen Modellen AuftragStatus.

Prozess (BPMN)	Use Cases	Zentrale Klassen	SD
01 KI-Sofortdiagnose	UC01, UC02, UC08	Voranmeldung, Medienanhang, KIDiagnosevorschlag, Kostenvoranschlag	SD1
02 Auftragsannahme	UC03, UC17	Reparaturauftrag, Geraet, Filiale, Werkstattleiter	–
03 Fehlerdiagnose	UC04, UC05	Fehlerbefund, Techniker, KIDiagnosevorschlag	–
04 Kostenvoranschlag	UC06, UC07	Kostenvoranschlag, KvaPosition	SD2
05 Ersatzteil-Reservierung	UC08, UC09, UC12	Lagerbestand, ErsatzteilReservierung, Disponent	SD3
06 Ersatzteil-Bestellung	UC10, UC11	Lieferantenbestellung, Bestellposition, Lieferant	SD6
07 Reparaturdurchführung	UC13, UC14	Reparaturschritt, Arbeitszeitbuchung	SD4
08 Abholung	UC15	Rechnung, Servicemitarbeiter	–
09 Reklamation	UC16, UC03	Reklamation, Reparaturauftrag	SD5
10 Retoure	UC19	Lieferantenbestellung, Lagerbestand	–

Tabelle 9: Zuordnung von Prozessen, Use Cases, Klassen und Sequenzdiagrammen

Die Fristen sind festgelegt: Ein nicht abgeholtes Gerät wird nach der vierten Erinnerung verwertet, eine offene Rechnung nach der dritten erfolglosen Mahnung an das Inkasso übergeben und eine Bestellung nach der zweiten erfolglosen Liefermahnung storniert. Verwertete Geräte erhalten keinen eigenen Wert in AuftragStatus, weil die Verwertung ein Prozessende in Prozess 08 ist und kein Zustand des Auftrags.

6 Probleme und Herausforderungen

Perspektive. In der ersten Fassung waren wir gleichzeitig Werkstatt und Softwareanbieter. Erst die Rückfrage des Dozenten hat uns dazu gebracht, das zu klären. Die Prozesse blieben gültig, Texte, Use Cases und Klassenmodell (Mandant) mussten wir aber anpassen.

Pools und Lanes. Ein früher Entwurf zeigte Werkstatt und Disposition als getrennte Pools. Nach der Regel „Pool = Unternehmen, Lane = Rolle“ haben wir auf einen Pool mit Lanes umgestellt. Den Kunden hatten wir zunächst als Black Box gezeichnet. Weil so nicht sichtbar war, wann er antwortet oder entscheidet, bekam er einen eigenen Ablauf.

Lücken zwischen den Prozessen. Die Prüfung am 05.10.2026 zeigte, dass abgelehnte Aufträge nie abgeholt wurden und Warteschleifen keinen Ausstieg hatten. Seitdem läuft jede Rückgabe über Prozess 08, und jede Warteschleife hat einen Ausstieg.

Einheitliche Begriffe. Datenobjekte, Klassen, Lebenslinien und Statuswerte müssen wortgleich sein. Frühere Datenobjekte hießen etwa „KVA-Position“ statt KvaPosition, und ein Zustand „eingeplant“ kam in AuftragStatus gar nicht vor. Ändert sich ein Prozess, müssen wir deshalb auch die Use Cases und Sequenzdiagramme prüfen. Nach den Korrekturen an Prozess 07 mussten wir zum Beispiel SD4 nachziehen.

Werkzeuge. Visual Paradigm war unser größtes Werkzeugproblem. Vier von sechs Gruppenmitgliedern arbeiten mit Firmen-Laptops, auf denen keine zusätzlichen Programme installiert werden dürfen; sie konnten Visual Paradigm nicht nutzen. Die gesamte UML-Arbeit lag damit bei zwei Personen, die übrigen haben die Diagramme anhand der Exporte geprüft. Dazu kommt, dass der Teamwork-Server der DHBW nur über das Lehre-VPN erreichbar ist.

Überschriebene Diagramme. Viel Zeit hat uns ein Fehler beim Abgleich mit dem Teamwork-Server gekostet: Beim Update wurden das Use-Case-Diagramm und das Klassendiagramm mit älteren Versionen aus dem Repository überlagert. Aktuelle und alte Elemente lagen danach übereinander, Beziehungen waren doppelt vorhanden, und ein Aufräumen von Hand brachte bei jedem weiteren Abgleich neue Überlagerungen. Lösbar war das nur, indem wir beide Diagramme im Repository vollständig neu angelegt haben. Seitdem gilt: vor jeder Sitzung Update, nach jeder Änderung sofort Commit, und nie zwei Personen gleichzeitig im selben Diagramm.

Camunda Modeler. Der Modeler meldet für Camunda 8 fehlende technische Angaben wie Task-Definitionen oder Timer-Ausdrücke als Fehler. Wir haben die Diagramme entsprechend ergänzt, bis das Problems-Panel keine Einträge mehr zeigte.

Zusammenarbeit. Am 05.10.2026 legten zwei Pull Requests parallel eine Entscheidung mit derselben Nummer an. Die Konflikte wurden an zwei Stellen gleichzeitig gelöst. Seitdem holen wir vor jeder neuen Entscheidung den aktuellen Stand und nehmen die nächste freie Nummer.

7 Feedback

7.1 Feedback des Dozenten und Umsetzung

Bei der Konzeptvorstellung bekamen wir zwei Hinweise: Wir sollten unsere Perspektive klären und dem Produkt ein Alleinstellungsmerkmal geben, das ruhig visionär sein dürfe, zum Beispiel KI-Funktionen. Wir haben uns daraufhin als Solution Provider positioniert (Abschnitt 2.2) und die KI-Sofortdiagnose entwickelt (Abschnitt 2.5). Fragen zum Vorgehen klären wir in den Gruppenterminen direkt mit dem Dozenten.

Im Coaching am 15.10.2026 sah der Dozent das Use-Case-Diagramm als zu verbunden an: Einzelne Akteure hingen an bis zu acht Use Cases. Sein Vorschlag war, je Use Case eine Rolle anzustreben, Akteure bei Bedarf mehrfach darzustellen und die Zuordnung der Rollen zu Personen einem Organigramm zu überlassen. Wir haben das Diagramm auf 15 Mitarbeiterrollen umgebaut und die Rollen in Tabelle 7 den Klassen und Lanes zugeordnet (Abschnitt 5.3).

7.2 Unser Feedback zur Fallstudie

Am meisten gebracht hat uns, ein Szenario durchgehend von der Prozessanalyse bis zum Sequenzdiagramm zu modellieren. Erst dabei wurde sichtbar, wie eng BPMN, Use Cases und Klassenmodell zusammenhängen. Die Reviews im Zweierteam und die gemeinsamen Prüfungen in den Gruppenterminen haben mehr Fehler gefunden, als wir beim Modellieren selbst bemerkt hätten.

Viel Aufwand steckte in Dingen am Rand der eigentlichen Analyse, etwa im Zugang zum Teamwork-Server und in den technischen Angaben, die der Camunda Modeler verlangt. Beim nächsten Mal würden wir früher festlegen, welche Datei die verbindliche Quelle eines Modells ist, und das UML-Modell schon im ersten Sprint in Visual Paradigm anlegen.
